


Hameau de La Borie Basse – Création d’un réseau d’assainissement et d’un réseau d’eau potable



Local de surpression

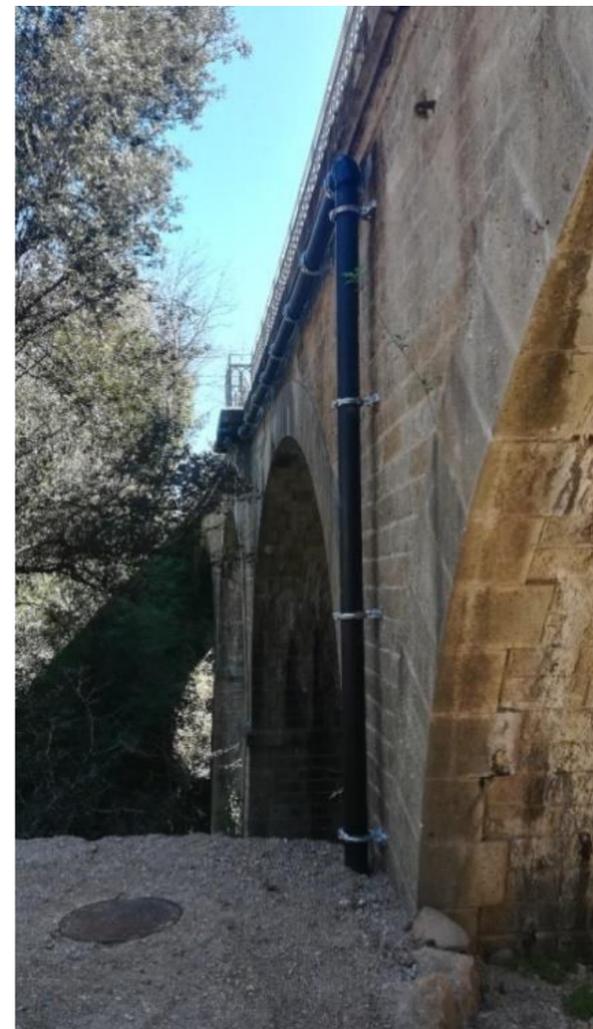

Encorbellement en canalisation PEHD Pré-isolée et collier de fixation en Aluminium AS 13

Descriptif Technique

La commune a souhaité engager les travaux nécessaires pour desservir en eau potable le hameau de la Borie Basse et l’assainir.
 Pour cela, il a fallu créer des nouveaux réseaux depuis les réseaux existants. Pour l’eau potable, 1140 ml depuis le réseau situé au village avec la mise en place d’un surpresseur dans un local car le hameau est plus haut que le village. Pour l’assainissement, 615 ml de réseau gravitaire depuis le hameau vers le réseau existant situé route de Saint Pons.

Caractéristiques principales :

- AEP :**
- Fonte DN 125 mm C40 : 435 ml
 - PEHD DN 90 mm : 610 ml
 - PEHD Pré-isolé DN 90 mm en encorbellement : 50 ml
 - PEHD DN 50 mm : 45 ml
 - Branchement : 10 u
 - Poteau incendie : 3 u
 - Essai pression et potabilité
 - Station de pompage de type surpresseur capable d’alimenter en eau potable le hameau composé de 6 habitations et 1 poteau incendie en fin de réseau (30 m3/h à 1bar).
- EU :**
- PVC SN8 DN 200 mm : 615 ml
 - Regard de visite PEHD
 - Branchement : 10 u
 - Réfection de chaussée : 1 000 m2
 - Essais et contrôles des ouvrages (ITV, Test d’étanchéité à l’air, Compactage)

Maître d’œuvre :
 CETUR LR - 13, Rue des Pountils
 34 600 LE POUJOL SUR ORB

Maître d’Ouvrage :
 COMMUNE DU POUJOL SUR ORB

Composition de l’équipe de Maître d’Œuvre :
 M. CAYUELA Damien : Gérant
 M. METGE David : Chargé d’Affaires

Nature et localisation des travaux :
 Hameau de La Borie Basse

Date de réception des travaux :
 Travaux réalisés en 2018/2019
 Réception : Avril 2019

Appréciation du donneur d’ordre sur la mission du prestataire :

Travaux conformes et réglementaires par rapport au projet initialement prévu

Je soussigné *Robin Y*, certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Le *7 Février 2020*

(Signature et cachet du Donneur d’Ordre)

