CETUR LR
CONSEILS ETUDES DE TRAVAUX URBAINS ET RURAUX LANGUEDOC ROUSSILLON
e-mail : cetur@cetulr.com
site internet : cetulr.com
MAÎTRES D'OEUVRE DAMIEN & JOSIAN CAYUELA
LOTISSEMENTS - ADDUCTION D'EAU - ASSAINISSEMENT - ÉLECTRICITÉ - VRD - GÉNIE CIVIL - BATIMENT - ÉCLAIRAGE PUBLIC - C.S.P.S.

OPQIBI L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE CERTIFICAT N° 10 08 2221

COMMUNE DE SAINT-PONS-DE-THOMIERES

TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DE LA VILLE – AMENAGEMENT DE LA PLACE DU FOIRALET

Maître d'Ouvrage :
Commune de Saint-Pons-de-Thomières

Composition de l'équipe de Maître d'Œuvre :
M. Cayuela – Melle Harranger

Nature et localisation des travaux :
Travaux de mise en valeur de la ville – Aménagement de la Place du Foiralet

Date de réception des travaux :
12/06/2009

Montant de l'opération :
108 068.25 euros HT

Carte de localisation des Travaux

Place du Foiralet

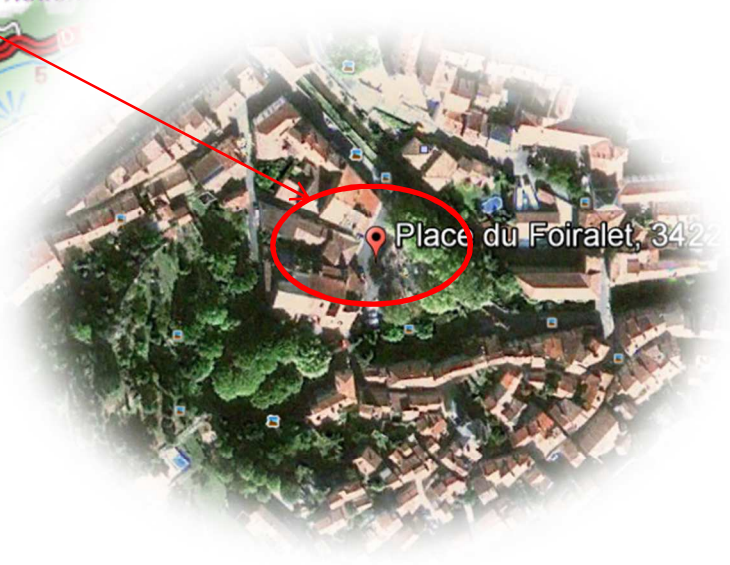

Descriptif des travaux :

Dans le cadre de la mise en valeur de la ville, la commune a souhaité poursuivre son effort en aménagent la Place du Foiralet, accueillant chaque année les festivités communales et passage obligé pour atteindre la source du Jaur.
Les travaux ont consisté au réaménagement des places de parking, matérialisées par un revêtement en Béton Désactivé (520 m²) et des pavés en porphyre rouge (510 ml).
La zone de circulation a été reprise en totalité (2000 m² d'enrobé) et l'accès à la rivière sécurisé (70 ml).

Avant Travaux

Après Travaux

Avant Travaux
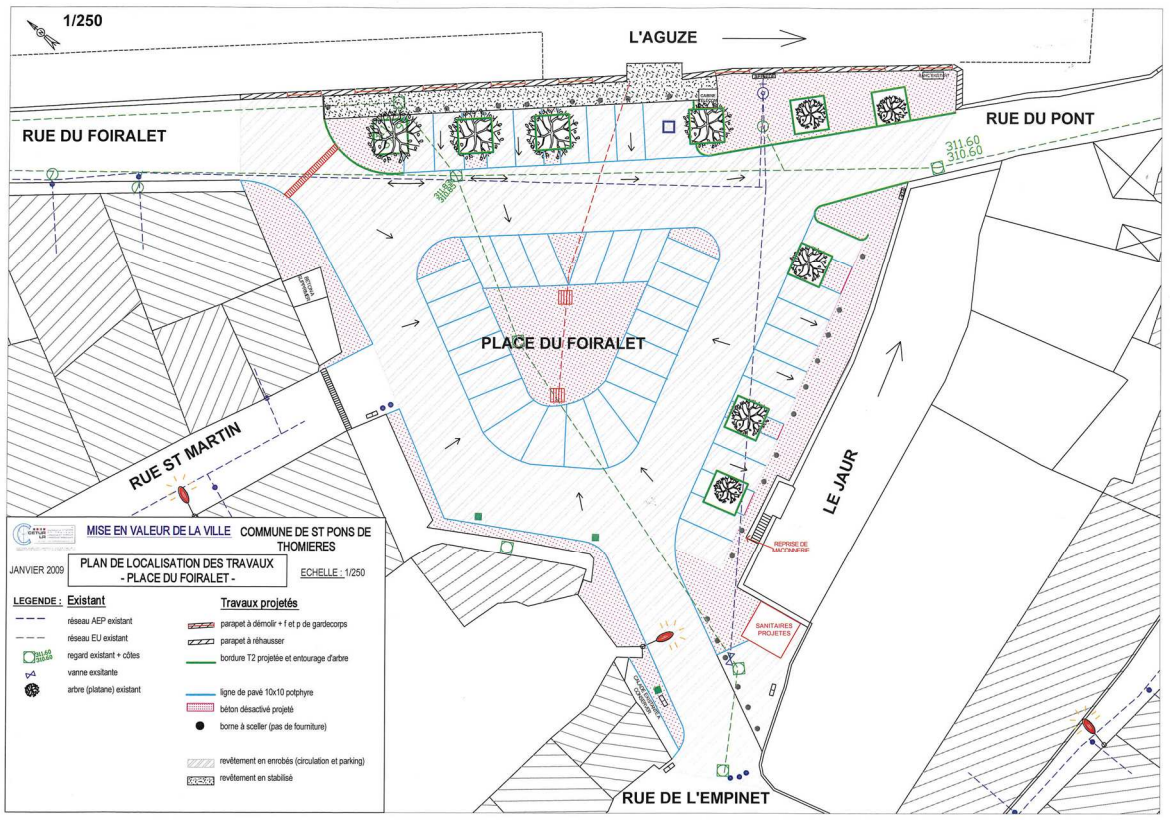
Après Travaux
